
20' DV konteinera uzstādīšana uz betona plātnēm

Balstu shēma zem stūra fitingiem · standarta 20 pēdu jūras konteiners (ISO 668, tips 1CC) · visi izmēri milimetros


izmēri plātņu nospraušanai
konteinera izmēri (uzziņai)
balstu asis (plātņu centri) un diagonāles

SKATS NO AUGŠAS — PLĀTŅU IZVIETOJUMS

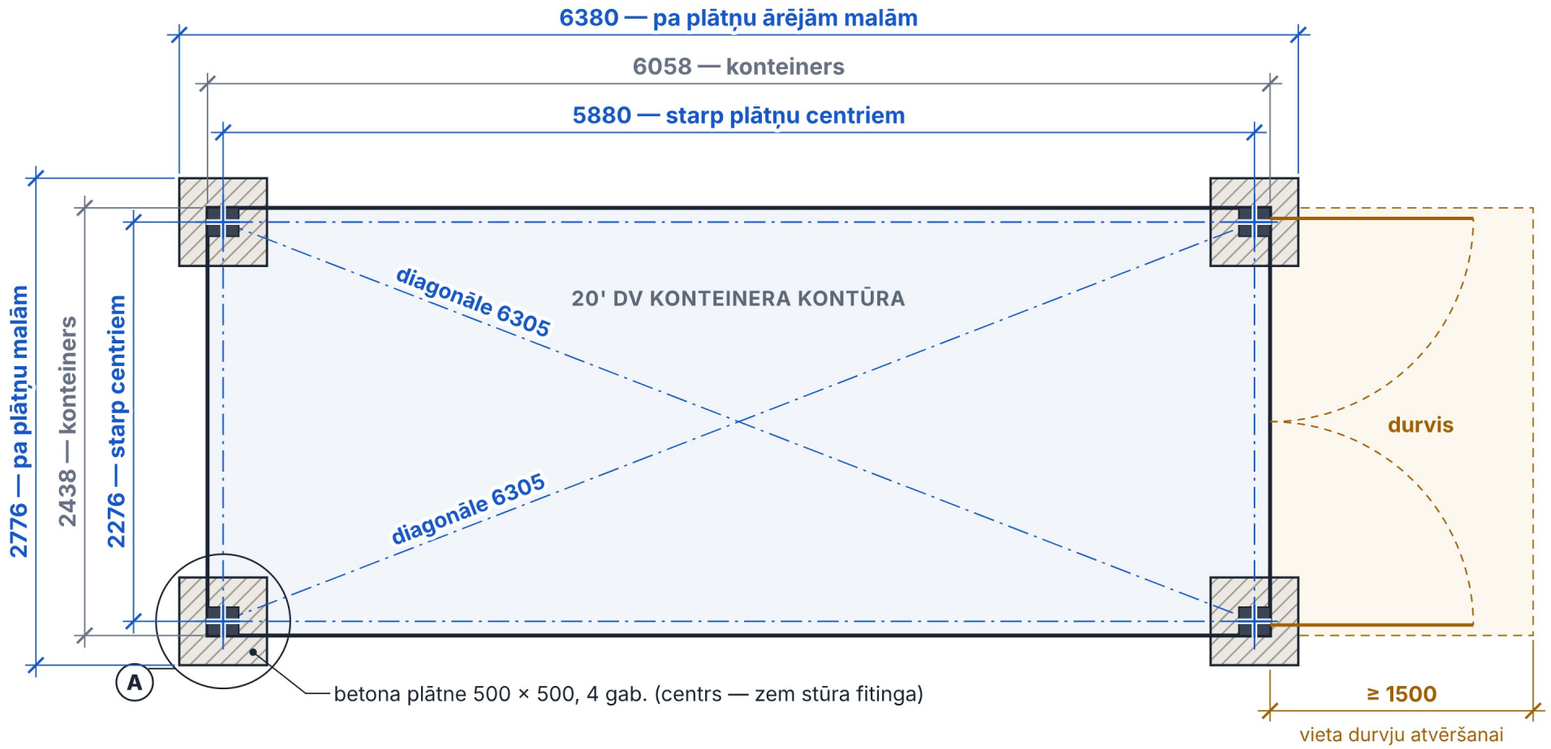


MEZGLS A — KONTEINERA STŪRIS UZ PLĀTNES

skats no augšas, palielināts

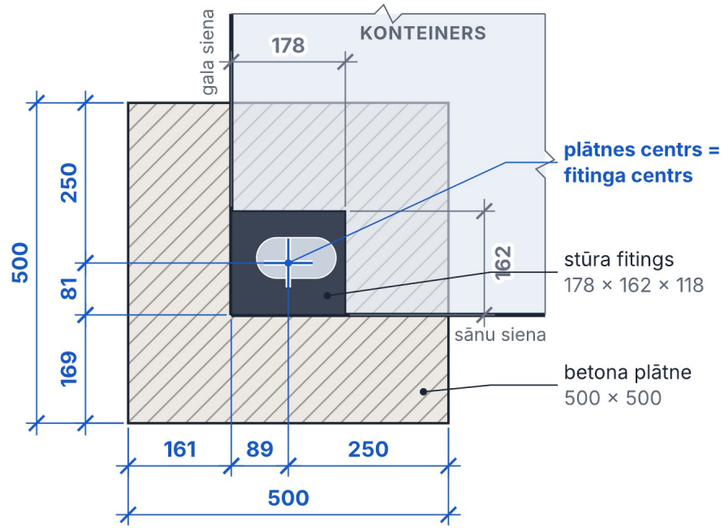

Plātni centrē zem stūra fitinga. Plātne 500 × 500 izvirzās ārpus konteinera kontūras par 161 mm gala pusē un par 169 mm sānos — tā ir **rezerve ≈ ±16 cm** neprecizitātei, novietojot konteineru ar celtni vai no platformas.

SĀNSKATS

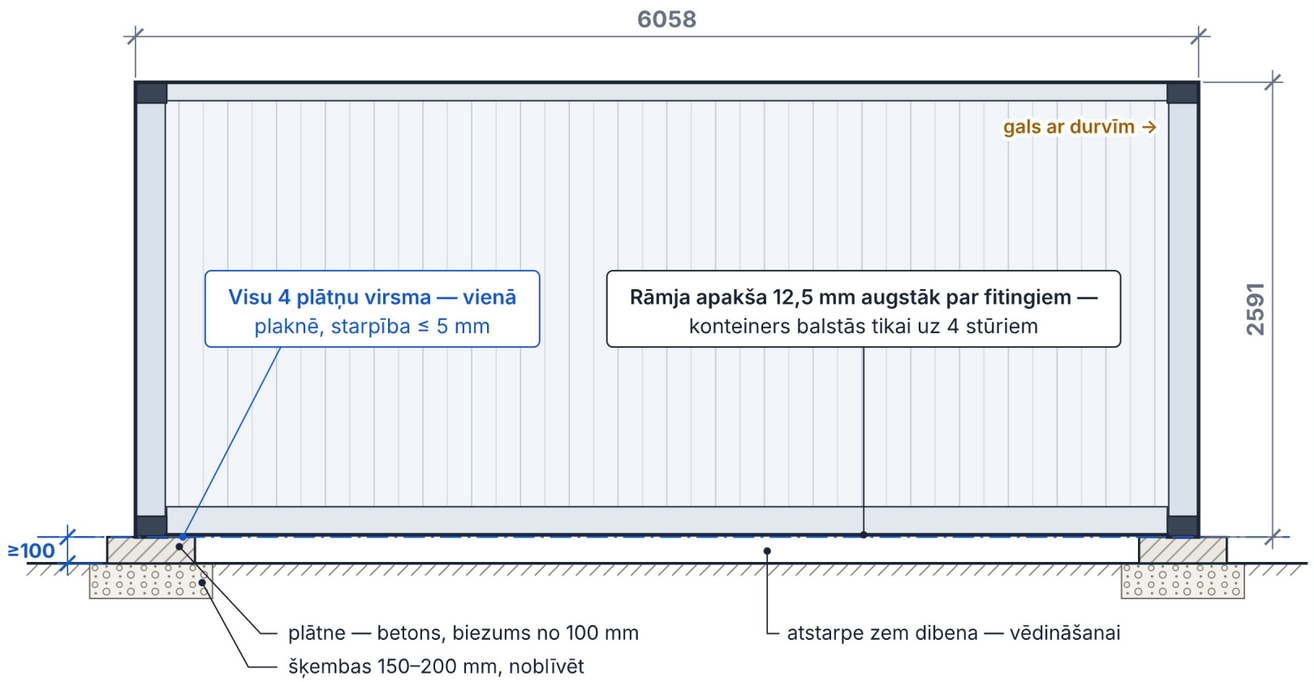

KĀ NOSPRAUST PLĀTNES

1. Nostiept auklu taisnstūrī **6380 × 2776 mm** — pa plātņu ārējām malām.
2. Pārbaudīt auklas diagonāles: abām jābūt **6958 mm** (starpība ≤ 10 mm).
3. Ielikt plātnes ar stūriem auklas stūros — plātņu centri veidos taisnstūri **5880 × 2276 mm**.

PAMATNE

- Zem plātnēm noņemt velēnu, izbērt šķembas 150–200 mm un noblīvēt.
- Plātnes — masīvs betons, biezums no 100 mm; plānas bruģa plātnītes var saplaisāt.
- Visu 4 plātņu virsma — vienā plaknē, **±5 mm**, citādi korpuss sašķiebsies un durvis vērsies grūti.
- Plātnes vismaz 100 mm virs zemes, lai dibens tiktu vēdināts.
- 20' konteineram pietiek ar 4 stūra balstiem, vidējie nav vajadzīgi.
- Durvju priekšā atstāt vismaz 1,5 m brīvas vietas.

KONTEINERS 20' DV

Ārējie G × P × A	**6058 × 2438 × 2591**
Iekšējie, ≈	**5898 × 2352 × 2393**
Durvju aile P × A, ≈	**2340 × 2280**
Stūra fitings	**178 × 162 × 118**
Pašmasa	**≈ 2,1–2,3 t**
Slodze uz 1 plātni	**¼ no masas ar kravu**

JA PLĀTNES IR CITĀ IZMĒRĀ

Plātņu centri vienmēr 5880 × 2276, diagonāle 6305.

plātne	aukla ārpusē	diagonāle	rezerve
400 × 400	6280 × 2676	6826	±11 cm
500 × 500	**6380 × 2776**	**6958**	**±16 cm**
600 × 600	6480 × 2876	7090	±21 cm

iekrāsots — ieteicamais variants

Izmēri — pēc ISO 668 un ISO 1161. Konkrēta konteinera garums var būt līdz 6 mm mazāks, platums — līdz 5 mm; plātņu rezerve to sedz.
